



ゴールコン

標準施工フロー

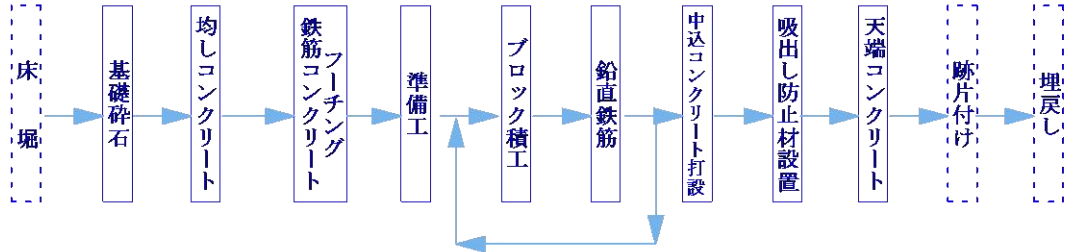

他工法との施工費比較

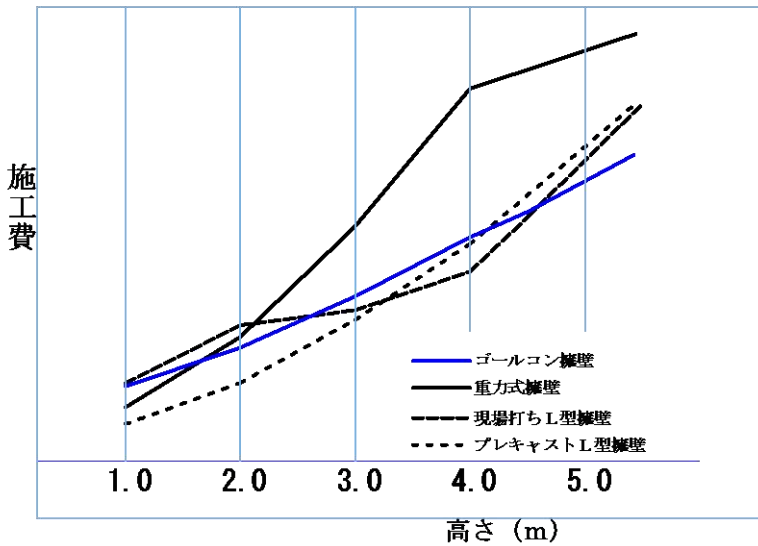

(例) 現場打との比較

比較数量・工期			施工歩掛表					
	ゴールコン	RC逆T擁壁	名称	500型	1000型	1500型	N1500型	N2000型
現場打ち コンクリート	123.0 (m ³)	229.0 (m ³)	世話役	2.4	2.8	2.8	2.8	3.3
型枠	55.0 (m ²)	270.6 (m ²)	ブロック工	4.0	4.6	4.6	4.6	5.5
鉄筋	11.3 (t)	20.2 (t)	特殊作業員	2.4	2.8	2.8	2.8	3.3
足場	106.0 (掛m ²)	212.0 (掛m ²)	普通作業員	6.1	7.0	7.0	7.0	8.4
ゴールコン	162.0 (個)	-	(人/100m ² 辺り)					
工期	22日	30日						
	割合 70%	割合 100%						
壁高さ 10m、延長 10.652m								
